


Būvdarbu vietas lokālais aprīkojums

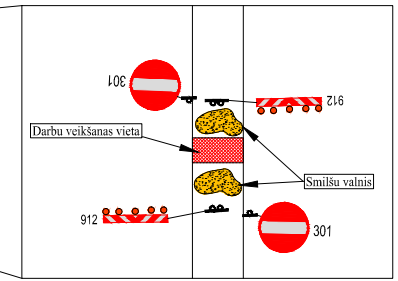

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laikā, t.sk. pēc darba laika un brīvdienās.
 Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
 Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartā LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
 Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem un operatīvajam transportam.
 Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām.
 Esošās ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/aižklāt.
 Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
 Ceļa zīmes Nr. 118+804/808+301+804/808 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.

OBJEKTS	Valsts nozīmes ūdensnotekas Titurga atjaunošana, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	
BŪVUZŅĒMĒJS	SIA "Latvijas meliorācija" "Kalēji", Dzintari, Daugmales pagasts, Ķekavas novads Reģ. Nr. 40003807991
ATBILDIGAIS BŪVDARBU VADĪTĀJS ATBILDIGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Jānis Bondars t. 29636118
RASĒJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot caurtekas nomainīu Priezu ielā, Alejās, Ķekavas novadā
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"
